



Bundesministerium
für Digitales und
Staatsmodernisierung



FIT-AB Status-Update Vorprojekt Deutschland-Architektur

Projektleitung: BMDS, FIT-AB

11.11.2025

Projektstatusbericht: Vorprojekt zur Erarbeitung und Initialisierung einer (konfigurierbaren) Deutschland-Architektur



Eckdaten i	
<u>Zeitraum:</u> 07.2025 – 01.2026	<u>Meilenstein:</u> Umsetzung/Konzeption
<u>Federführung:</u> [REDACTED]	
Status 📋	
<u>1. Welche Arbeiten werden im aktuellen Meilenstein gerade durchgeführt?</u>	
<ul style="list-style-type: none">• Alle Arbeitspakete in den fünf Zielbereichen wurden gestartet. Arbeitsschwerpunkte im aktuellen Meilenstein waren Geschäftsfähigkeiten, Prozessschritte und Funktionsbausteine zum Wertstrom „Inanspruchnahme einer digitalen Verwaltungsleistung“ sowie das Methoden-Handbuch.• Die Definitionen zu D-Architektur und D-Stack wurden dem LA vorgelegt.• Ein Präsenz-Workshop mit dem Projektteam und dem LA wurde am 29.09. in Berlin und ein weiterer wird am 17./18.11. in Bremen durchgeführt. Das Projektteam hat die Arbeitspakete noch stärker auf die geplanten Ergebnisse ausgerichtet.	
<u>2. Welche Schritte stehen als nächstes an?</u>	
<ul style="list-style-type: none">• Fortsetzung in allen Arbeitssträngen (siehe Folie zu Sprints).	
<u>3. Welche Ergebnisse/ Ergebnisbestandteile/ Artefakte wurden in diesem und im vorangegangenen Meilenstein bereits fertig erstellt?</u>	
<ul style="list-style-type: none">• Definition und Scope der Deutschlandarchitektur wurden finalisiert.• Ersten Artefakte existieren als Zwischenstände, die dem LA am 20.11. vorgelegt werden.	


Änderungen gegenüber Planung ↩
<u>1) Änderungen ggü. inhaltlicher Planung</u>
Keine
<u>(2) Änderungen ggü. Umsetzungsplanung</u>
Keine
Risiken/Probleme und Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none">• Projekt ist im Juli gestartet, hat sich dann mit den ersten LA-Sitzungen Ende August jedoch neu strukturiert → Verzögerung um min. 1 Monat.• Heterogenes Projektteam aus Institutionen mit unterschiedlicher Vorarbeit und bisherigen Interessenschwerpunkten → Team-Building, Ergebnisfokussierung ohne Perfektionismus (80/20)• Parallelarbeit in D-Stack-Missionen und D-Architektur-Projekt → Enge Abstimmung notwendig, personelle Vermaschung der Teams, Aufgabenabgrenzung weiterhin schwierig.
Abstimmungs- oder Entscheidungsbedarf
<ul style="list-style-type: none">• Aktuell gibt es keinen Entscheidungsbedarf, der über den Lenkungsausschuss hinausgeht.• Es ist geplant die Ergebnisse des Vorprojekts dem FIT-AB nach Beschlussfassung im LA Anfang Februar vorzulegen.



Projekt-Scope: Zielbereiche des Vorprojektes

Auftrag IT-Planungsrat: Föderale Digitalstrategie für die Verwaltung (22.10.2024)

4.2.2 Wir bauen eine „Deutschland-Architektur“ auf.

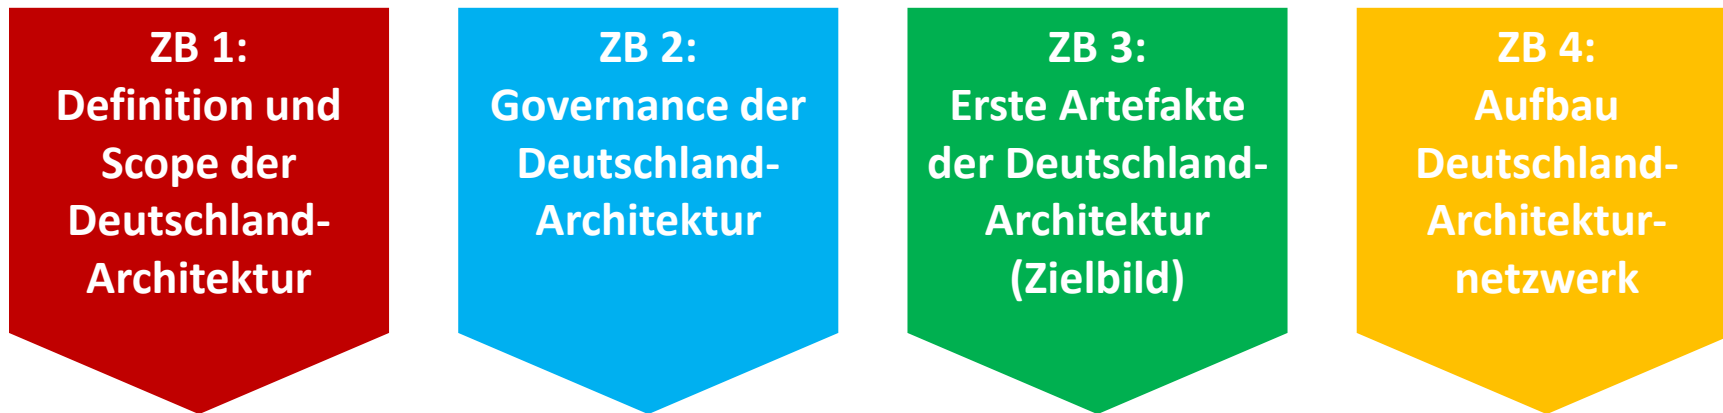

ZB 5: Roadmap-Entwurf u.a. auf Basis von IT-Portfoliomanagement



Die Arbeitspakete orientieren sich an Liefergegenständen.

ZB1 Definition und Scope			ZB2 DA-Governance			ZB3 DA-Zielbild			ZB4 DA-Netzwerk			ZB5 DA-Roadmap		
LG11 Definition Begriff & Scope	LG12 Beschlussvorlagen IT-PLR	LG13 Ergebnispräsentation	LG21 Zusammenarbeitsstruktur	LG22 Governance-Konzept	LG23 Architektur-glossar	LG31 D-Arch-Artefakte	LG32 Interaktive Lösungs-landkarte	LG33 Methoden-Handbuch	LG41 Architektur-Netzwerk & -Konzept	LG42 Kommuni-kations-konzept	LG43 D-Arch-Event 2026	LG51 Roadmap-Inhalte	LG52 Interaktive Roadmap	LG53 Folgeantrag /-anträge

	LG31A Architektur-Repository		LG31D Wertstrom- und Fähigkeitenkarte		LG31G Nachnutzungs-/Betriebsmodell
	LG31B Vision und Ziele		LG31E Geschäftsprozesse zum Wertstrom		LG31H Big-Picture-Modell
	LG31C Architekturprinzipien		LG31F ABB/SBB-Modellierung zum Wertstrom		LG31Z D-Architektur-Dokument

Entwurf der Kurzdefinition Deutschland-Architektur



Die **Deutschland-Architektur** ...

- bildet einen kohärenten **Ordnungsrahmen** für die zielgerichtete Steuerung und systematische Beschreibung gemeinsamer Geschäftsfähigkeiten der deutschen Verwaltung und ihre Unterstützung durch die IT in Bund, Ländern und Kommunen.
- regelt das **Zusammenspiel** der von ihr beschriebenen **Bausteine** sowohl untereinander als auch nach außen.
- schafft die Grundlage für die **Enterprise-Architektur** der deutschen Verwaltung nach TOGAF.

Das Vorprojekt hat klare Schwerpunkte gesetzt und arbeitet diese agil in 2-Wochen-Sprints ab.

